智能手表 IPD · WBS 计划框架

公开实践框架 + 智能手表工作包 + 可定制工作日计划

168	15	14	400 / 104
工作包 / 节点	评审 / 里程碑记录	Excel 工作表	预置任务行 / 甘特周数


六阶段主干 · 前置 Charter 授权 · 横向跨职能协同

01 概念	02 计划	03 开发	04 验证	05 发布	06 生命周期
客户价值与技术可行性	方案、资源与商业基线	完整产品包与集成	设计、准入与制造验证	量产、交付与上市	质量、维护与经营复盘
TR1 / CDCP	TR2 / TR3 / PDCP	TR4 / EVT退出 / TR5	DVT / PVT / TR6 / ADCP	MP / GA	维护 / 复盘 / 退出

投资决策 DCP、技术评审 TR、样机验证 EVT/DVT/PVT 分别留证；排期日期不自动产生放行结论。

示例阶段视图

示例配置：中国大陆 · 蓝牙 / App / 云 / GNSS · 新平台完整开发

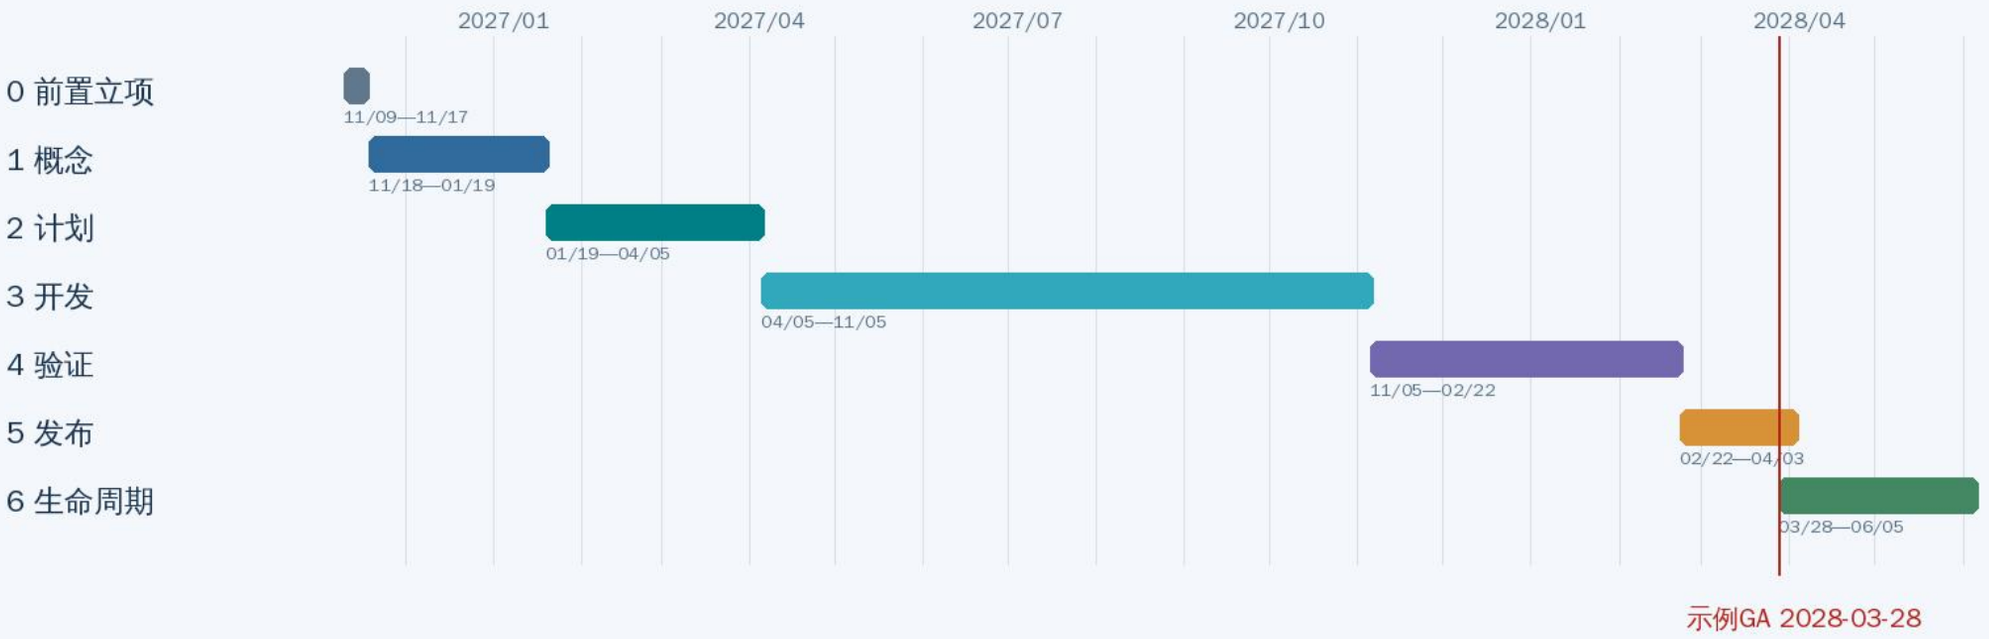

可调：功能 / 市场、工期、前置、日期约束、责任、投入、交付物、判据、节假日与补班。

示例尚未录入法定节假日，未做资源排平。工期、验收目标与认证适用性须按项目确认。
